BUT Informatique – 2e année

IUT de Maubeuge – Université Polytechnique Hauts-de-France

SAÉ 3.01

Système de gestion scientifique d'un laboratoire de recherche

Rapport provisoire – fin du Sprint 1

Équipe K.A.B.L

Aïssa Ouameur Kieran Lelong Lucas Deudon Brahim Haddadi

14 octobre 2026

Table des matières

1 Planification du projet **2**
1.1 Contexte . . . 2
1.2 Outils . . . 2
1.3 Calendrier . . . 2
1.4 Backlog . . . 2
1.5 Trello . . . 3

2 UML et navigation **4**
2.1 Diagramme de classes . . . 4
2.2 Les rôles . . . 4
2.3 Navigation . . . 5

3 Maquettes **6**
3.1 Maquettes Moqups . . . 6
3.2 Résultat . . . 6

4 Sprint 1 **9**
4.1 Objectif . . . 9
4.2 US du sprint . . . 9
4.3 Ce qu'on a fait . . . 9

5 Review du Sprint 1 **10**
5.1 Résultats . . . 10
5.2 Le bug de l'US-01 . . . 10
5.3 Ce qu'on ne peut pas encore tester . . . 10
5.4 Vélocité et burndown . . . 11
5.5 Rétrospective . . . 11

6 Planification du Sprint 2 **13**
6.1 Objectif . . . 13
6.2 US du sprint . . . 13
6.3 Pourquoi 36 SP ? . . . 13
6.4 Ordre . . . 13
6.5 Sprint 3 . . . 13

1. Planification du projet

1.1. Contexte

Le projet consiste à créer un site web pour un laboratoire de recherche d'environ 350 personnes. Le site permet de gérer l'organisation du laboratoire (départements, groupes, personnels), de déclarer les activités scientifiques et de faire des bilans sur une période.

Ce que le client nous a demandé lors de l'entretien du 2 septembre 2026 :

- garder tout l'historique (on ne supprime jamais rien) ;
- chacun ne voit que ce qui le concerne (droits pyramidaux) ;
- une activité faite à plusieurs a un seul porteur, pour éviter les doublons ;
- la saisie doit être simple ;
- c'est le RH qui crée les comptes.

1.2. Outils

Outil	Utilisation
Trello	Suivi du backlog et des sprints
GitHub	Partage du code : une branche par personne, puis fusion dans main
PHP / PostgreSQL	Langage et base de données du site (sans JavaScript)
Supabase	Hébergement de la base de données
Alwaysdata	Hébergement du site
Moqups	Maquettes des pages

1.3. Calendrier

Nous sommes en alternance (FA), le projet se fait donc en 3 sprints.

Sprint	Début	Revue	Temps en autonomie
Sprint 0	02/09/2026	15/09/2026	9 h
Sprint 1	16/09/2026	13/10/2026	15 h
Sprint 2	14/10/2026	06/11/2026	18 h
Sprint 3	20/11/2026	06/01/2027	12 h

Le Sprint 0 a servi à comprendre le sujet, préparer l'entretien avec le client et écrire le backlog.

1.4. Backlog

Le projet est découpé en 16 user stories (US). Chaque US a une taille, convertie en story points (SP) :

XS	S	M	L
2 SP	3 SP	5 SP	13 SP

US	Intitulé	Priorité	Taille	SP
US-01	Socle de données historisé	Must	L	13
US-02	Identifier les personnels	Must	M	5
US-03	Se connecter	Must	M	5
US-04	Droits pyramidaux	Must	M	5
US-05	Déléguer ses droits	Should	XS	2
US-06	Déclarer une activité individuelle	Must	S	3
US-07	Déclarer une activité collective	Must	M	5
US-08	Confirmer sa participation	Must	S	3
US-09	Rechercher, filtrer et trier ses activités	Must	XS	2
US-10	Tableau de bord	Must	M	5
US-11	Générer son rapport d'activités	Must	M	5
US-12	Importer les enseignements (ICS)	Must	M	5
US-13	Importer les publications (HAL)	Must	M	5
US-14	Ouvrir une campagne de saisie	Must	S	3
US-15	Geler les données d'une campagne	Should	S	3
US-16	Rouvrir une campagne	Should	XS	2
			Total	**71**

1.5. Trello

Chaque US est une carte Trello. Elle passe de la colonne « Backlog » à « Sprint », puis « En revue » et enfin « Validé par le client ».

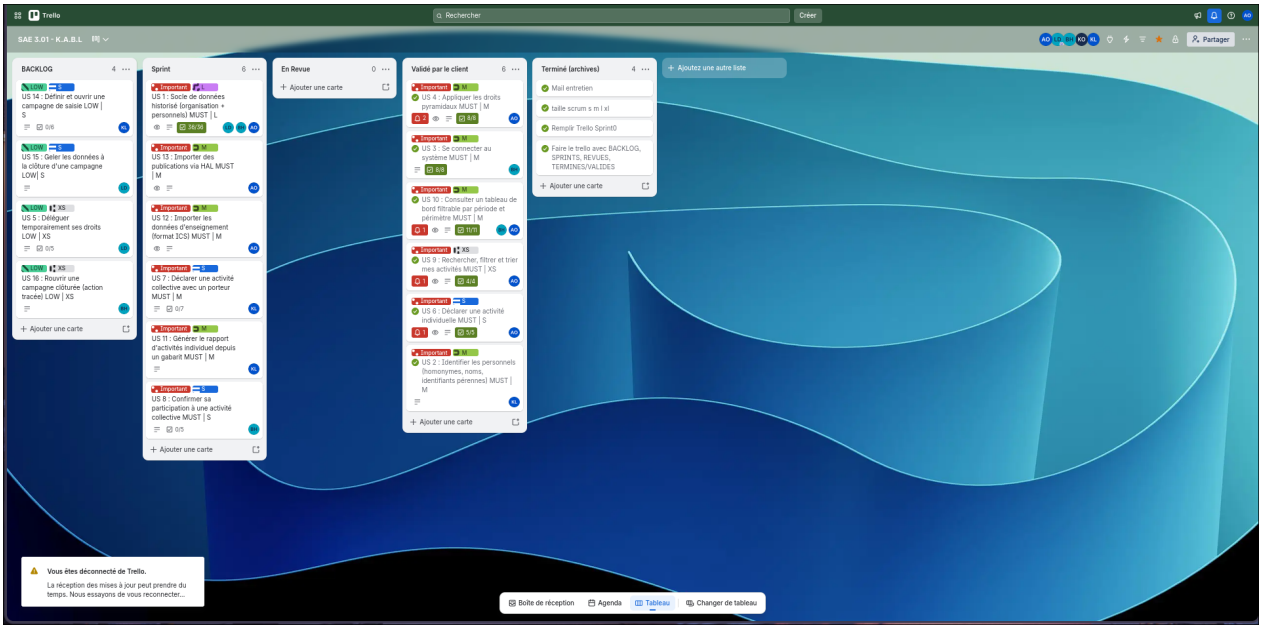


FIGURE 1 – Notre Trello à la fin du Sprint 1

2. UML et navigation

2.1. Diagramme de classes

Chaque information qui change dans le temps a une date de début et une date de fin. Comme ça, on peut toujours savoir où était une personne à une date donnée.

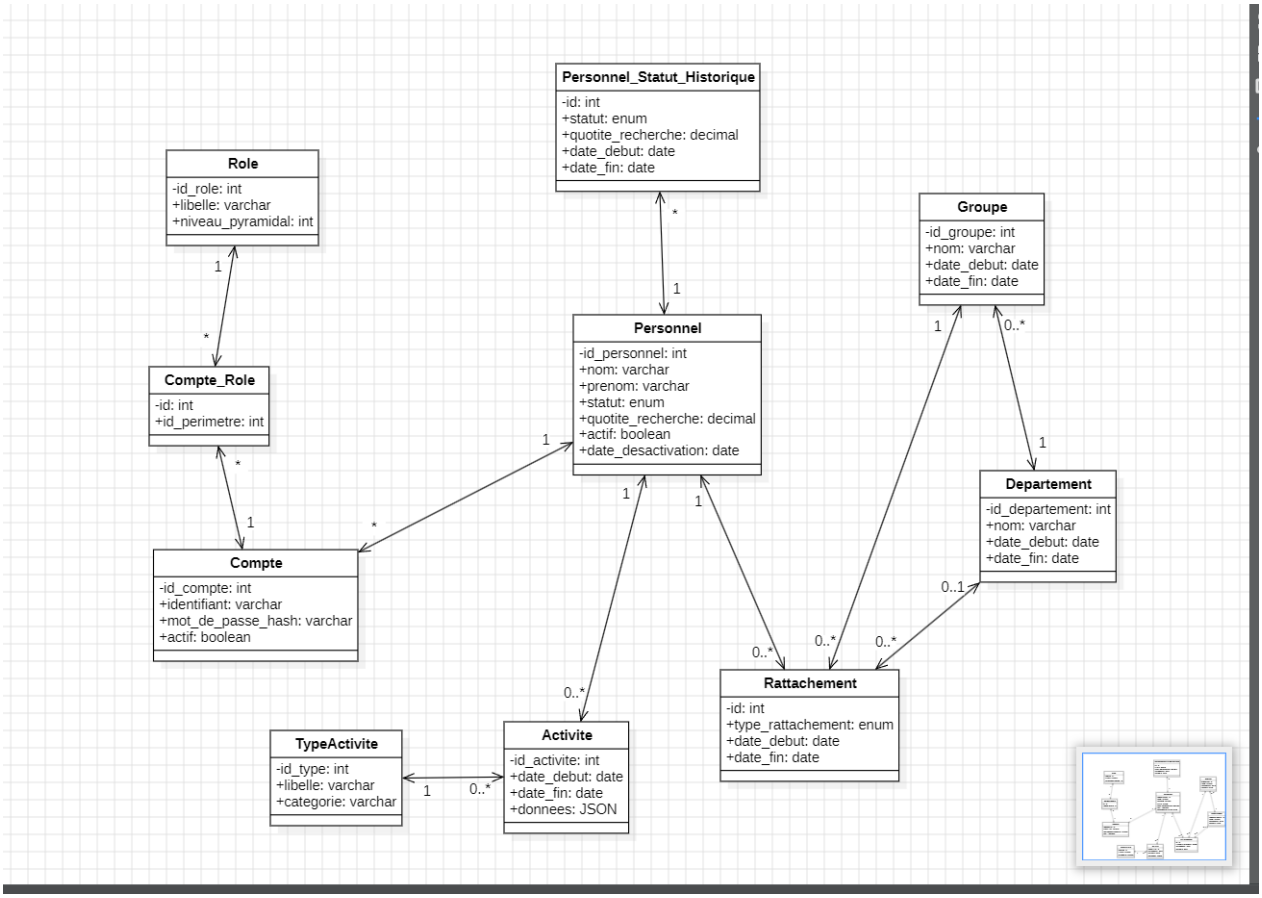


FIGURE 2 – Diagramme de classes

Le diagramme va être modifié au Sprint 2, car la base a évolué pendant le Sprint 1 :

- le statut est déplacé dans une table d'historique ;
- ajout d'une table pour l'historique des noms ;
- ajout de deux tables pour les champs propres à chaque type d'activité ;
- suppression de la colonne JSON qui ne sert plus ;
- ajout des tables pour les activités collectives.

2.2. Les rôles

Plus le niveau est petit, plus le rôle a de droits.

Rôle	Niveau	Ce qu'il voit
Administrateur	0	Tout, et il gère les rôles
Directeur de laboratoire	1	Tout le laboratoire
Responsable de département	2	Son département
Responsable de groupe	3	Son groupe
Gestionnaire RH	3	Tout le laboratoire, sauf le contenu scientifique
Personnel	4	Seulement ses activités

2.3. Navigation

Ce schéma montre comment on passe d'une page à l'autre. Le menu change selon le rôle.

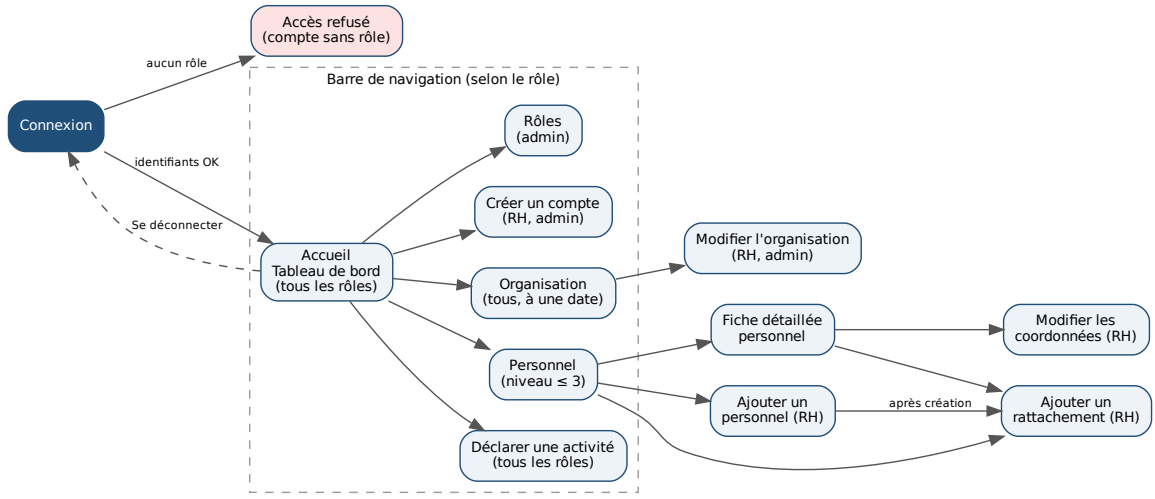


FIGURE 3 – Navigation du site

3. Maquettes

3.1. Maquettes Moqups

Les pages ont été dessinées sur Moqups avant de coder :
`https://app.moqups.com/FCmUROPXbEEDy2K8OQC7VEABEoHTtDMf/view/page/a982d3ae6`

À compléter : ajouter les captures des maquettes Moqups.

3.2. Résultat

Le site marche sur ordinateur, tablette et téléphone.

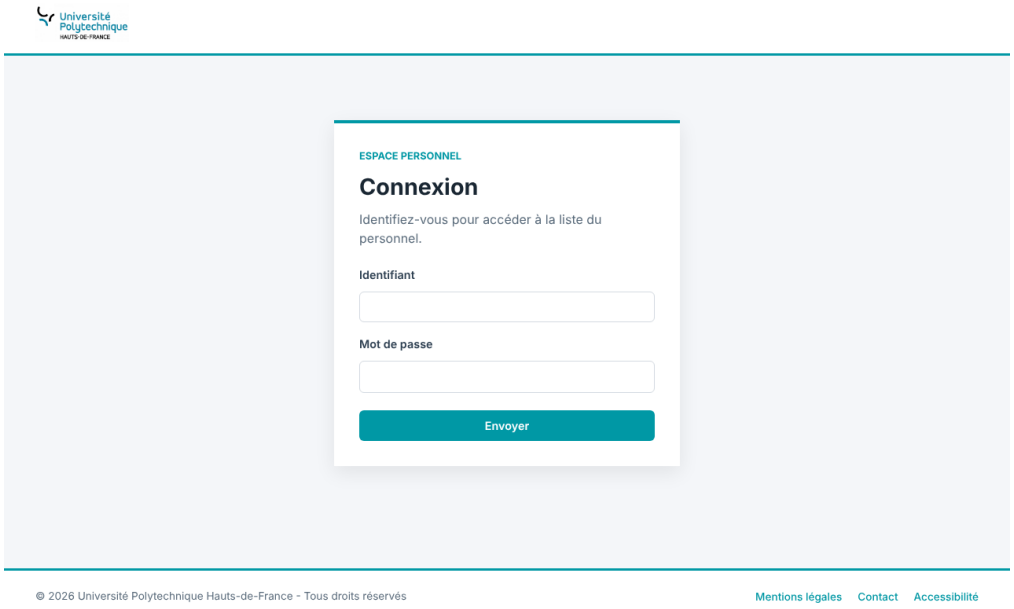


FIGURE 4 – Page de connexion

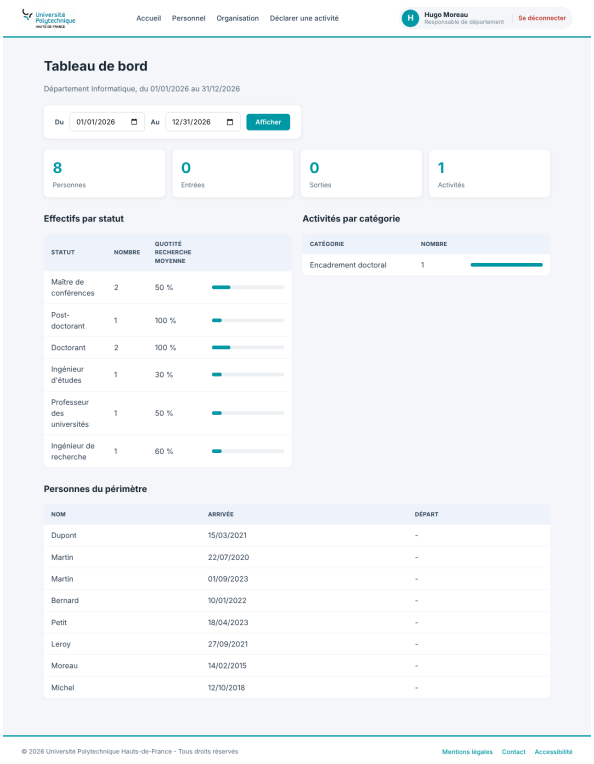


FIGURE 5 – Tableau de bord

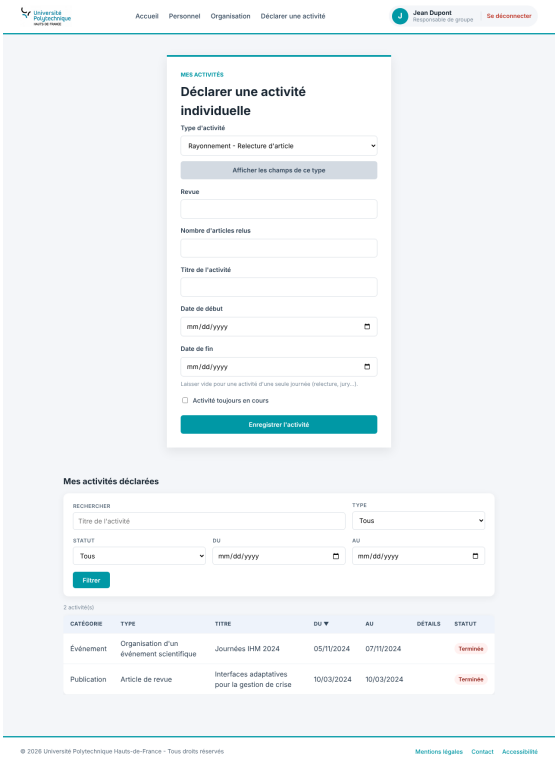


FIGURE 6 – Déclarer une activité

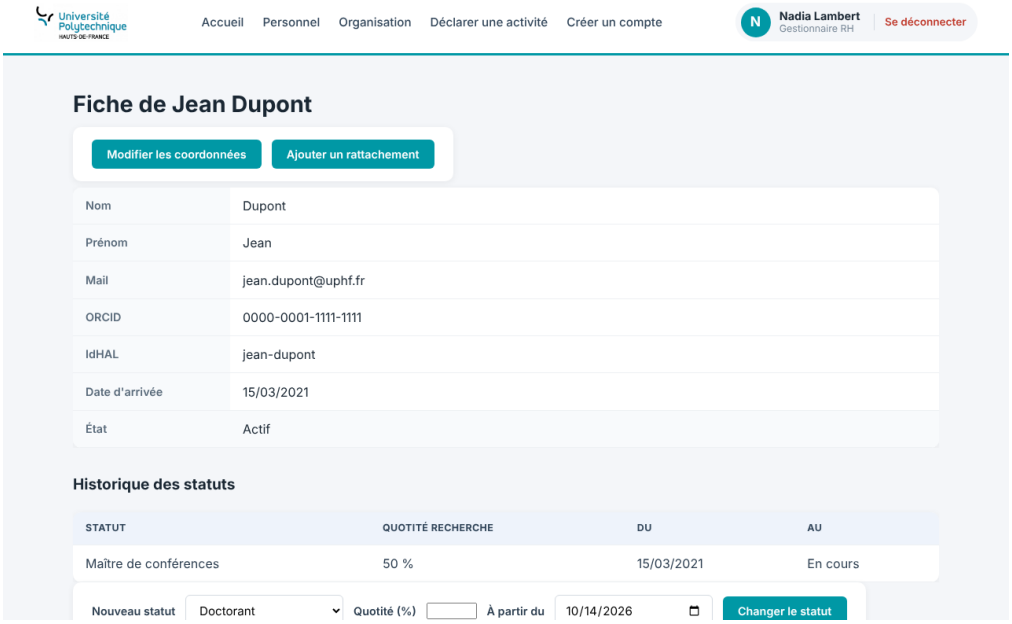


FIGURE 7 – Fiche d'un personnel

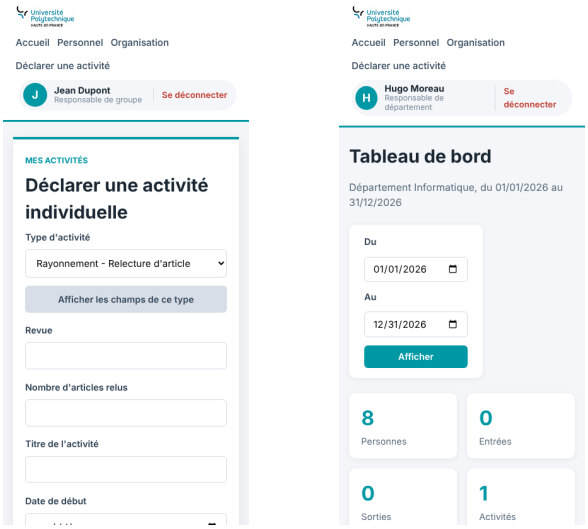


FIGURE 8 – Version téléphone

4. Sprint 1

4.1. Objectif

Permettre à un personnel de déclarer et de voir ses activités, avec l'historique et les droits.

4.2. US du sprint

US	Intitulé	Taille	SP	Qui
US-01	Socle de données historisé	L	13	Lucas, Brahim, Aïssa
US-02	Identifier les personnels	M	5	Kieran
US-03	Se connecter	M	5	Brahim
US-04	Droits pyramidaux	M	5	Aïssa
US-06	Déclarer une activité	S	3	Aïssa
US-09	Rechercher ses activités	XS	2	Aïssa
US-10	Tableau de bord	M	5	Brahim, Aïssa
		Total	**38**	

4.3. Ce qu'on a fait

US-01 : le RH crée les départements, les groupes et les personnels, les rattache, change leur statut, nomme les responsables et les désactive. Tout est daté.

US-02 : les homonymes sont différenciés, l'ancien nom est gardé, l'ORCID et l'IdHAL sont enregistrés.

US-03 : connexion avec un identifiant et un mot de passe.

US-04 : chacun ne voit que son périmètre. Le RH ne voit pas le contenu scientifique.

US-06 : on choisit un type d'activité et les bons champs s'affichent (par exemple « Revue » pour une relecture).

US-09 : recherche, filtres et tri sur ses activités.

US-10 : tableau de bord avec les effectifs, les entrées et sorties, et un graphique des activités.


5. Review du Sprint 1

5.1. Résultats

US	Intitulé	SP	Résultat
US-01	Socle de données historisé	13	**Partielle (bug)**
US-02	Identifier les personnels	5	Validée
US-03	Se connecter	5	Validée
US-04	Droits pyramidaux	5	Validée
US-06	Déclarer une activité	3	Validée
US-09	Rechercher ses activités	2	Validée
US-10	Tableau de bord	5	Validée

5.2. Le bug de l'US-01

Bug : sur la page Organisation, une personne apparaît **responsable de groupe alors qu'elle n'est dans aucun groupe**. C'est impossible : un responsable de groupe est forcément dans son groupe.

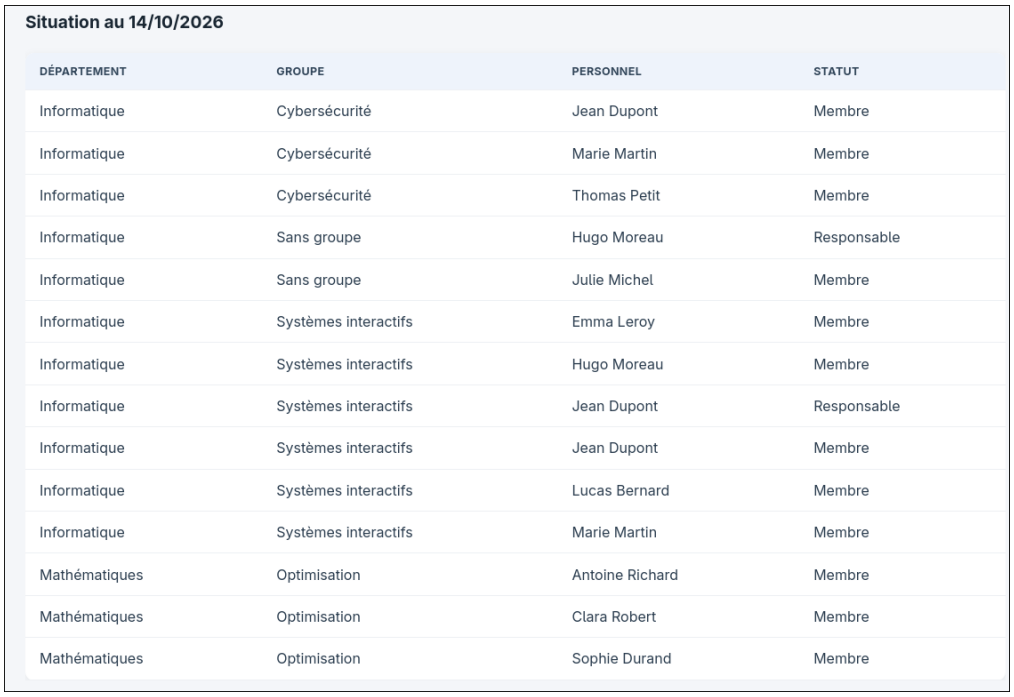

Situation au 14/10/2026

DÉPARTEMENT	GROUPE	PERSONNEL	STATUT
Informatique	Cybersécurité	Jean Dupont	Membre
Informatique	Cybersécurité	Marie Martin	Membre
Informatique	Cybersécurité	Thomas Petit	Membre
Informatique	Sans groupe	Hugo Moreau	Responsable
Informatique	Sans groupe	Julie Michel	Membre
Informatique	Systèmes interactifs	Emma Leroy	Membre
Informatique	Systèmes interactifs	Hugo Moreau	Membre
Informatique	Systèmes interactifs	Jean Dupont	Responsable
Informatique	Systèmes interactifs	Jean Dupont	Membre
Informatique	Systèmes interactifs	Lucas Bernard	Membre
Informatique	Systèmes interactifs	Marie Martin	Membre
Mathématiques	Optimisation	Antoine Richard	Membre
Mathématiques	Optimisation	Clara Robert	Membre
Mathématiques	Optimisation	Sophie Durand	Membre

FIGURE 9 – Hugo Moreau est « Responsable » sur la ligne « Sans groupe »

L'US-01 n'est pas comptée car elle n'est pas entièrement validée. Elle passe au Sprint 2.

5.3. Ce qu'on ne peut pas encore tester

- **US-02 :** le rapprochement avec un import sera testé avec l'import HAL (US-13).
- **US-10 :** le comptage par porteur sera testé avec les activités collectives (US-07).

5.4. Vélocité et burndown

Indicateur	Valeur
SP engagés	38
SP validés	25
Vélocité	25
SP restants	46

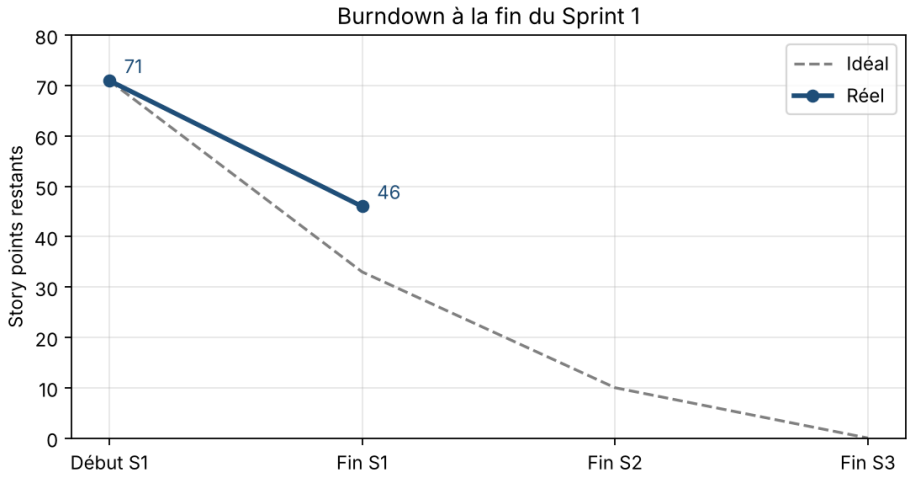


FIGURE 10 – Burndown

On a 13 SP de retard sur le prévu, c'est l'US-01.

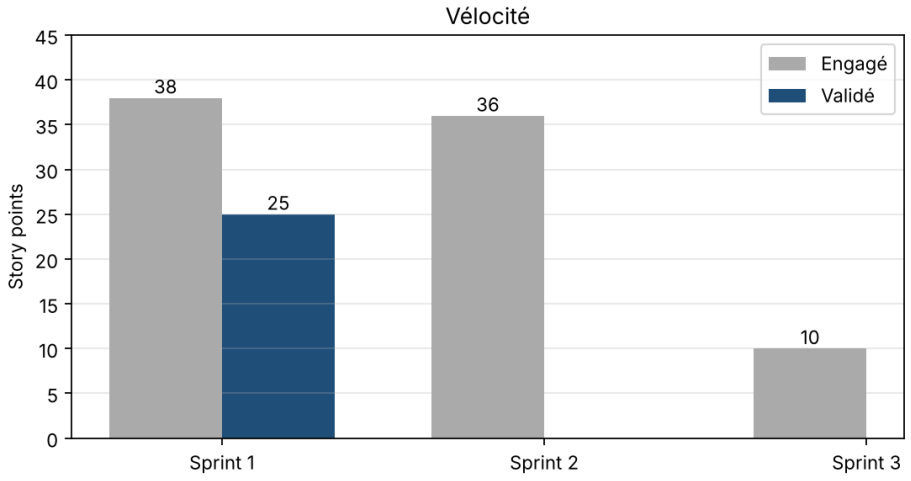


FIGURE 11 – Vélocité

5.5. Rétrospective

Ce qui a marché :

- 6 US sur 7 validées ;
- le site est en ligne.

À améliorer :

- découper les grosses US ;
- faire valider les US pendant le sprint, pas à la fin ;
- garder l'UML à jour.

6. Planification du Sprint 2

6.1. Objectif

Finir l'US-01, gérer les activités collectives, et faire les imports et l'export.

6.2. US du sprint

US	Ce que c'est	Taille	SP	Qui
US-01	Corriger le bug et faire valider	L	13	Lucas, Brahim, Aïssa
US-07	Activité faite à plusieurs, avec un seul porteur	M	5	Kieran
US-08	Les participants confirment leur participation	S	3	Brahim
US-11	Télécharger son rapport (Word ou CSV)	M	5	Kieran
US-12	Importer les enseignements (.ics)	M	5	Aïssa
US-13	Importer les publications depuis HAL	M	5	Aïssa
		Total	**36**	

6.3. Pourquoi 36 SP ?

Notre vélocité est de 25. Mais l'US-01 est presque finie, il ne reste que le bug. Sans elle, il y a 23 SP de nouveau travail, ce qui est proche de notre vélocité.

6.4. Ordre

1. Corriger l'US-01 en premier.
2. Ajouter les nouvelles tables et mettre à jour l'UML.
3. Faire les US-07, 11 et 12 en même temps.
4. Finir par l'US-08 et l'US-13, qui ont besoin de l'US-07.

6.5. Sprint 3

Il restera les US-05, 14, 15 et 16, soit 10 SP.
